


TRABAJOS PRIORITARIOS PARA REALIZAR:

- Canadon Bonito Arriba desde el campo de Celebrino al Pueblo beneficiaria a los productores Celebrino, \Vatros, Quinelen y Antimilla. Se debería realizar el camino nuevo en un total de 8 km.
- Neneo Ruca zona erosion por tormentas se debe realizar alcantarillas mas enriplado y rellenos en un total aproximado de 3 km.
- Camino a Tres Cerros se deben realizar enriplados y varitas alcantarillas en zona de mallines; caminos inundables. Totales aproximados entre 7 u 8 km.
- Comallo-Aneon Chico. Totales 45 km. Se deben realizar alcantarillas varitas y enriplado en un total aproximado de 12 km. Familias Marin, Juanico, Marino, Aviles y Nancurpay.
- Entre Ruta 67 y Aguada de Zorro. Totales 35 km. Se deben realizar trabajos varitas de relleno y enriplado. Productores Fernandez, Sanudo, Llancaqueo Ismael.
- Entre Ruta 67 y Pilahue Aldea. 12 km de trabajos en relleno y enriplado con realizacion de alcantarillas varitas.
- Zona Comallo Abajo sector Paso Limay realizacion de trabajos de enriplado en 45 km.
- Entre Comallo y Estancia (40 km.) y entre Comallo y Coquelen (100 km.), se deben reparar los caminos.
- Caminos Sandoval Daniel y Curlien Lucia (5 km.) y camino a Traipe (8 km.) trabajos varitas de enriplados y rellenos.
- Camino Fithahu cruce molin Rodriguez enriplado 200 mts. Ingreso Fila. Calupal Ovidio cruce Vados colocaci6n importante de alcantarilla doble y enriplado de 300 mts.
- Canadon Bonito entre Pichihueche y Curhuo ver la realizacion de nuevo trazo del camino (14 km.) o alcantarillas varitas relleno y enriplado en camino actual.
- Nahuelpan Adimacio camino a Tres Cerros subida a Nahuelpan realizacion de enriplado, ensanchado y cambio de sentido a una curva sobre el pie/filo del cerro 800 mts.
- Ver Subida Curin realizacion de enriplado y alcantarilla entre Evarista Neulman y Domingo Feliciano.
- Nuevo camino Fila Laureano Mtho. 15 km.
- Neneo Ruca cruce mallin Navarro enriplado 2 km y alcantarilla.
- Neneo Ruca entre casa de piedra y Martinez alcantarillas y caminos trabajos varitas 20 km.
- Canteras Comallo cruce Est. La Corneja y camino Federico Antrichipoy realizacion de alcantarilla y trabajos varitas de relleno y enriplado.

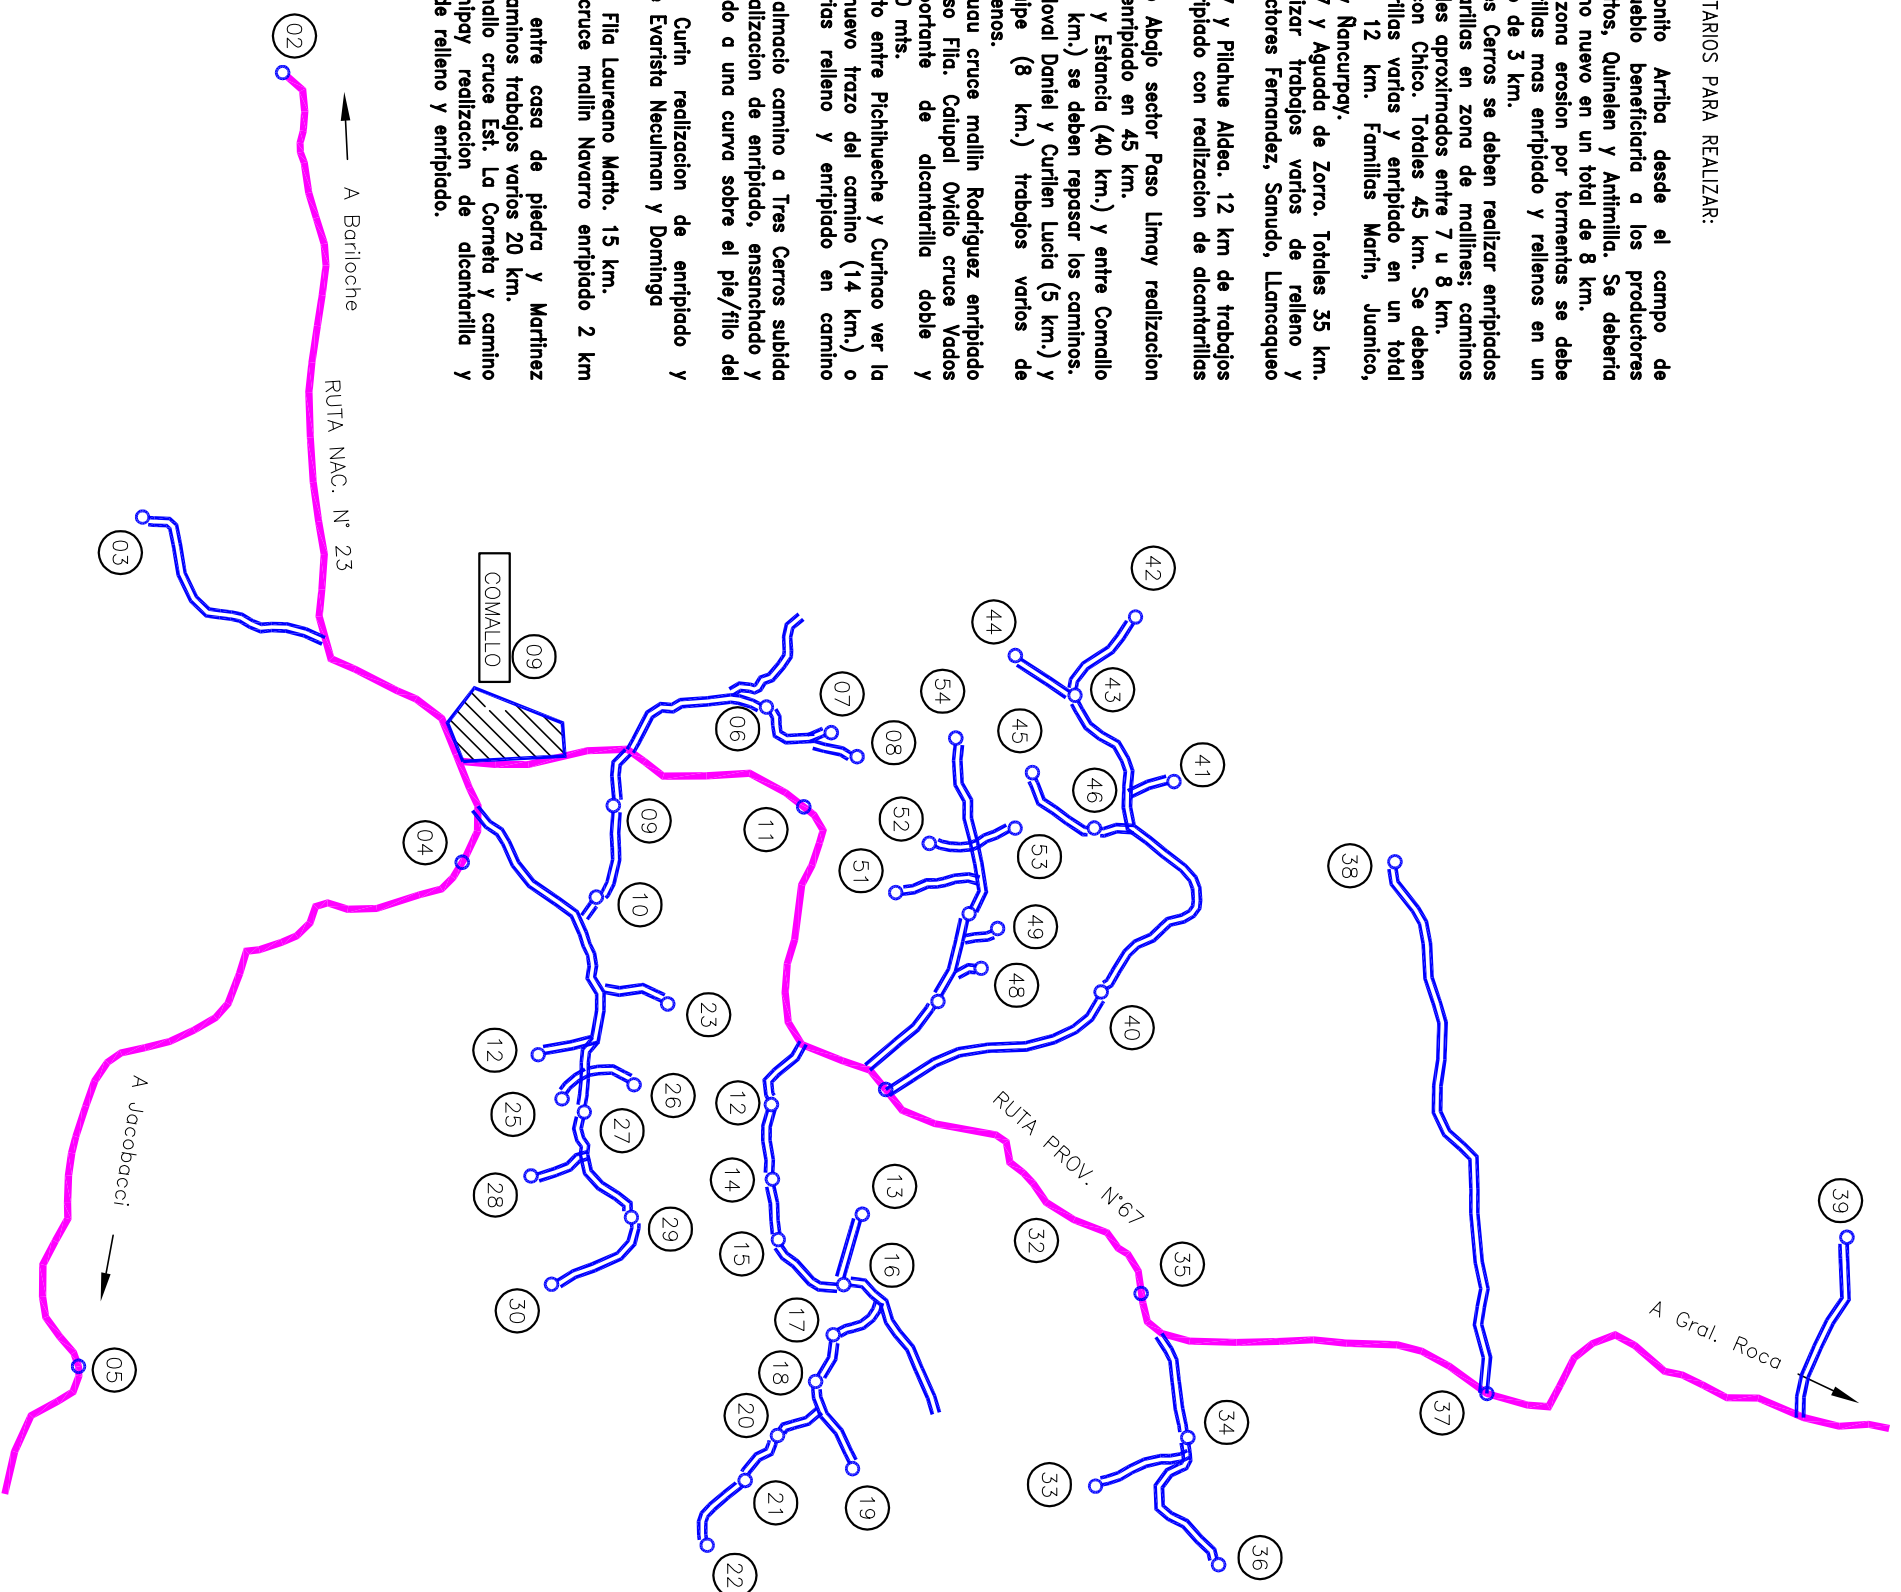

REFERENCIAS PUESTOS:

- 01 - Comallo
- 02 - Plica Viejo
- 03 - Neneo Ruca
- 04 - Tralichahue
- 05 - Clemente Oneill
- 06 - Oses
- 07 - Sanhutter
- 08 - Narnur Miguela
- 09 - Eduard Horacio
- 10 - Curin Antonia
- 11 - Eduard Palmentia
- 12 - Neulman
- 13 - Torres
- 14 - Curin Feliciano
- 15 - Nancurpay Teofilo
- 16 - Nancurpay Pedro
- 17 - Juanico Jose Maria
- 18 - Marino Domingo
- 19 - Linaras
- 20 - Aviles Ramon
- 21 - Marin Lucio
- 22 - Cardenas Benjamin
- 23 - Nahuelpan Adimacio
- 24 - Loncon Felisa
- 25 - Pallaliet Nicasio
- 26 - Naranbueno Pilar
- 27 - Castillo Manuel
- 28 - Vios Carmen
- 29 - Aviles Laureano
- 30 - Aviles Adrian
- 31 - Cañadon Chileno
- 32 - Las Mellizas
- 33 - Aguada de Zorro
- 34 - Dominguez Alfredo
- 35 - Pichumman Luis
- 36 - Wesley Tom
- 37 - Laguna Blanca
- 38 - Piquiniyeu del Limay
- 39 - Pilahue
- 40 - Fila. Rodriguez
- 41 - Paine
- 42 - Calupal Ovidio
- 43 - Quilaleo Evaristo
- 44 - Calfipal Irineo
- 45 - Colipe Jesus
- 46 - Paineffiu
- 47 - Demetrio Antrichipoy
- 48 - Virgilio Antrichipoy
- 49 - Meliqueo Mario
- 50 - Federico Antrichipoy
- 51 - Lincopan Alejandro
- 52 - Montenegro Adolfo
- 53 - Cayupill
- 54 - Salinas

NOTAS:
1 - El relevamiento de caminos fue realizado por personal del Municipio o Comisi6n de Fomento. La digitalizaci6n de la informaci6n se realiz6 en base a estos relevamientos y no posee escala de dibujo.

2 - La informaci6n plasmada en este plano tiene car6cter general. Se recomienda realizar un relevamiento previo de todos los sectores para cuantificar de manera exacta los trabajos a contratar.

3 - En general, gran parte de los caminos vecinales, son huellas, que con el paso del tiempo y sucesivos repasos pasaron a denominarse caminos, pero en su mayorfa no poseen mejoras, est6n sin enriplado, sin abovedado, sin alcantarillas y sin cunetas ni sangrfa. Excepto los reconocidos como vecinales por Validad.

REFERENCIAS:

FORMA	DESCRIPCION
	CAMINO VECINAL
	RUTA PROVINCIAL O NACIONAL
	RIO, ARROYO O CAUCE
	CANTERA DE RIPIO

FORMA	DESCRIPCION	Unid. Cant.
	CAMINO A REPARAR	242
	CAMINO A REPARAR	114
	CAMINO A REABRIR	37
	ALCANTARILLA A COLOC.	Unid. 30

DETALLE DE REPARACIONES:

-Enriplado: Este valor surge de la suma solicitada por el Municipio, pero debe tenerse en cuenta que las cantidades ser6n mucho menores ya que en muchos casos se hace referencia a por ejemplo "...trabajos de enriplados en 45 km ...". Por esta raz6n se sugiere evaluar in-situ las cantidades exactas, si es posible por personal t6cnico.

ESCALA : S/ESCALA
FECHA: ABRIL DE 2013
ELABORACION: Ing. W.Chala
Cel. 0298-154654525
RELEVAMIENTO: MUNICIPIO O COMISION DE FOMENTO

ENTE PARA EL DESARROLLO DE LA LINEA Y REGION SUR DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO
RELEVAMIENTO CAMINOS VECINALES
Municipios y Comisiones de Fomento Region Sur de Rio Negro

PLANO DE UBICACION Y EXTENSION DE CAMINOS A TRATAR
Municipalidad de COMALLO
Plano 1 de 1

PLANO: 03
REVISION: 00

